



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	INFRA-ESTRUTURA URBANA
---	-------------------------------

1 – Identificação

Conveniente Prefeitura Municipal de Itarana - ES		Processo de Convênio nº	83392945
		Convênio nº	096/2018
Identificação do objeto (conforme Plano de Trabalho) Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação no Centro de Itarana, nas Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.		Registro SECONT nº	
		Data de assinatura do Convênio	07/11/2018
Valor Total Contratado (R\$)	Valor Total Conveniado(R\$)	Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (R\$)
R\$ 931.289,79	R\$ 1.167.544,30	R\$ 988.406,28	R\$ 179.137,02
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
Processo de Prestação de Contas nº	2020-DX5XV	Data de recebimento	18/02/2022

2 – Dados do Convênio

Vigência Original:	07/11/2018 a 07/08/2019		
Prorrogação do Convênio:	1 TA Adequação do cronograma de desembolso. 2 TA: 08/08/2019 a 07/12/2019 3 TA: Aditivo de valor 4 TA: 08/12/2019 a 02/10/2020 5 TA: 03/10/2020 a 31/12/2021		
Data de início da obra:	11/11/2019	Data de conclusão da obra:	21/12/2020

4 – Execução dos Serviços

Item	Discriminação dos Serviços	% de Execução*	Valor (R\$) *
1.1	Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação no Centro de Itarana, nas Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.	100%	889.965,83
TOTAL		100%	889.965,83
* Dados aproximados considerando vistoria in loco e análise das medições apresentadas pelo Conveniente.			

5 – Itens de Controle



Item	Discriminação				
1	Análise Documental – Termo de Aceitação da Obra				
1.1	Há cópia do Termo de Aceitação Definitiva da obra?	X	Sim		Não
1.2	No caso de excepcionalidade prevista no art.73 da lei nº 8.666/1993, há cópia do Termo de Aceitação Provisória da obra?		Sim		Não
1.3	O objeto descrito está de acordo com o aprovado no Plano de Trabalho?	X	Sim		Não
1.4	Há a assinatura do Prefeito Municipal ou do Secretário responsável pelo setor de Obras?	X	Sim		Não
1.5	Há a identificação (nome, número do registro no CREA) e assinatura do técnico municipal responsável para a fiscalização do Conveniente da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s)?	X	Sim		Não
1.6	Observações:				
2	Análise Documental – Medições e ARTs				
2.1	Há Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico municipal responsável pela fiscalização da(s) obra(s) do convênio, com respectivo comprovante de pagamento?	X	Sim		Não
2.2	Há Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução da(s) obra(s) do convênio, com respectivo comprovante de pagamento?	X	Sim		Não
2.3	Há cópia de todas as medições realizadas, atestadas e pagas?	X	Sim		Não
2.4	Os serviços medidos estão compatíveis com o Projeto aprovado?	X	Sim		Não
2.5	Os serviços medidos conferem com os serviços aparentemente executados?	X	Sim		Não
2.6	Observações:				
3	Análise Documental – Relatório de Cumprimento do Objeto				
3.1	Há o Relatório de Cumprimento do Objeto?	X	Sim		Não
3.2	O objeto descrito está de acordo com o aprovado no Plano de Trabalho?	X	Sim		Não
3.3	O relatório apresenta informações suficientes sobre a execução do objeto?	X	Sim		Não
3.4	Se a resposta ao item 3.3 for negativa , indique quais informações complementares devem ser apresentadas pelo Conveniente:		Sim		Não
3.5	Está devidamente assinado pelo técnico municipal responsável pelo recebimento da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s)?	X	Sim		Não
3.6	Está devidamente assinado pelo Ordenador de Despesas do Município Conveniente?	X	Sim		Não
3.7	Observações:				
4	Análise Documental - Relatório de Execução Físico-Financeira – Anexo C				



4.1	Existe alguma incoerência / falha no preenchimento do quadro relativo à parte técnica do formulário?		Sim	X	Não						
4.2	Se a resposta ao item 4.1 for POSITIVA , indique quais as correções a realizar:										
5	Visita Técnica Final										
5.1	Data da visita	12/08/2022									
5.2	Foi instalada placa(s) de obra(s) referente ao convênio, de acordo com o modelo indicado pela SEDURB?	X	Sim		Não						
5.3	A obra foi executada no terreno indicado?	X	Sim		Não						
5.4	Houve alteração/ampliação do projeto aprovado por parte do Convenente?		Sim	X	Não						
5.5	Se sim, descreva a alteração do projeto e a justificativa do Convenente:										
5.6	A proposta de alteração do projeto foi comunicada ou aprovada pela SEDURB?		Sim	X	Não						
5.7	A execução da obra ocorreu dentro do prazo de vigência do Convênio?	X	Sim		Não						
5.8	Houve alguma dificuldade ou impropriedade ou paralisação da obra que prejudicou o desenvolvimento dos serviços?		Sim	X	Não						
5.9	Se a resposta ao item 5.7 for POSITIVA , descreva a o que ocorreu, as soluções adotadas e a justificativa apresentada pelo Convenente:										
5.10	Qual a opinião desta área quanto a respeito do que ocorreu e das soluções adotadas pelo Convenente:										
5.11	Qual a qualidade aparente dos serviços?		Boa	X	Satisfatória		Razoável		Fraca		Péssima
5.12	Observações:										
6	Análise Técnica - Conclusões										
6.1	A execução do convênio ocorreu conforme o aprovado?		X	Sim							Não
6.2	Se a resposta ao item anterior for NEGATIVA , descreva o(s) fato(s) que motivou(aram) a não execução do serviço em conformidade ao aprovado e a(s) justificativa(s) apresentada(s) pelo Convenente:										
6.3	Qual a opinião desta área quanto ao(s) fato(s) que motivou(aram) a não execução do serviço em conformidade ao aprovado e a(s) justificativa(s) apresentada(s) pelo Convenente										
6.4	Os objetivos avençados foram atingidos?		X	Sim							Não
6.5	Houve desvio de finalidade?			Sim	X						Não
6.6	O objeto pactuado foi cumprido?		X	Sim							Não
6.7	Em que medida o objeto pactuado foi atingido? (Mensurar em percentual)	100%									
6.8	Se a medida de execução do objeto pactuado não for igual 100% (cem por cento), indique os motivos que levaram à baixa execução do convênio:										

6 – Relatório Fotográfico

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTÁ EM ANEXO, NO FINAL DESTES DOCUMENTOS.



7 – Parecer Técnico

Conforme as medições apresentadas nas peças #98, #100, #102, #104 e #106 segue o quadro abaixo, com o somatório de todas as medições.

Medições	Data	Valor Apresentado	Valor Aprovado
1ª medição	22/01/2020	R\$ 191.358,71	R\$ 191.358,71
2ª medição	05/03/2020	R\$ 198.296,10	R\$ 198.296,10
3ª medição	06/04/2020	R\$ 219.202,52	R\$ 219.202,52
4ª medição	04/05/2020	R\$ 195.559,66	R\$ 195.559,66
5ª medição	30/11/2020	R\$ 85.548,83	R\$ 85.548,83
Total		R\$ 889.965,82	R\$ 889.965,82

Face ao exposto e aos documentos apresentados somos favoráveis a aprovação da prestação de contas final, sob o ponto de vista técnico, cujo valor total executado foi de R\$ 889.965,82.

8 – Encaminhamento

Para conhecimento e providências.

Vitória, 16/08/2022

Lucas Inácio Menegardo
Mat.: 3795730



Rua José Colnago



Rua José Colnago



Rua José Colnago



Rua José Colnago



Rua José Colnago



Rua José Colnago



Rua Dom Luiz Scortegagna



Rua Dom Luiz Scortegagna



Rua Dom Luiz Scortegagna



Rua Dom Luiz Scortegagna



Rua Dom Luiz Scortegagna




Rua Dom Luiz Scortegagna

Edifício Ames
Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 20º e 21º andar, Centro, Vitória- CEP 29.010-901
Gestão de Convênios - Tel.: 3636-5004



Alameda Antônio Ferreira de Jesus

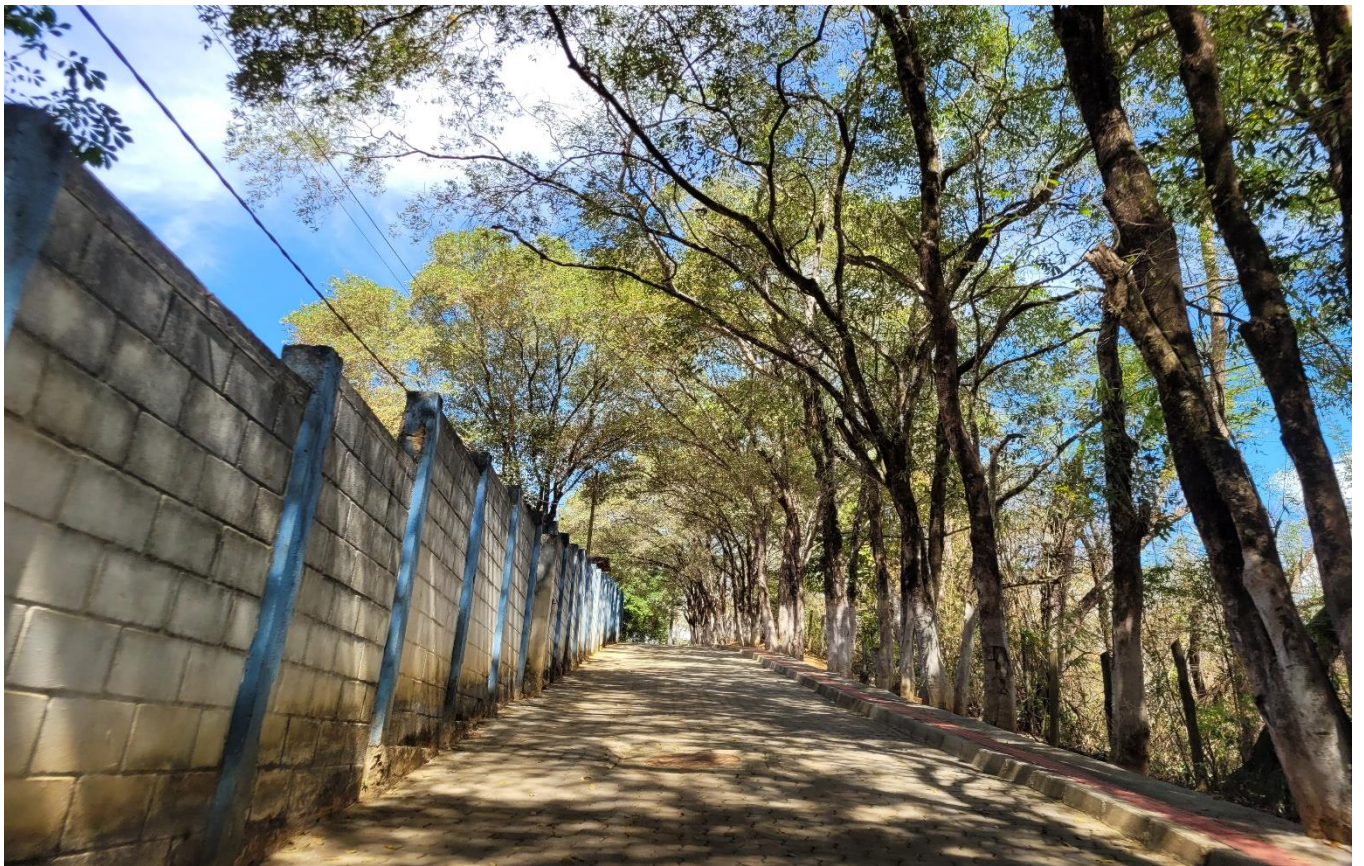

Alameda Antônio Ferreira de Jesus



Alameda Antônio Ferreira de Jesus



Alameda Antônio Ferreira de Jesus



Alameda Antônio Ferreira de Jesus

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUCAS INACIO MENEGARDO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GESCONV - SEDURB - GOVES
assinado em 16/08/2022 16:33:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/08/2022 16:33:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUCAS INACIO MENEGARDO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GESCONV - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-6R6VVL>
